



Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la Coesione Territoriale



Stato di attuazione della ricostruzione nel cratere abruzzese

L'Aquila - 21 Marzo 2013



Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la Coesione Territoriale

1. La ricostruzione: gennaio 2012 - marzo 2013

2. L'avvio degli Uffici Speciali per la Ricostruzione

3. Le Risorse finanziarie

4. Lo Stato di attuazione

5. Lo Sviluppo




1. La ricostruzione: gennaio 2012 - marzo 2013

La ricostruzione in Abruzzo
dopo il terremoto
del 6 Aprile 2009

Tempi necessari al completamento
della ricostruzione:
8/10 anni*

Ulteriori costi stimati per la ricostruzione:
circa 10 miliardi euro
(aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati)

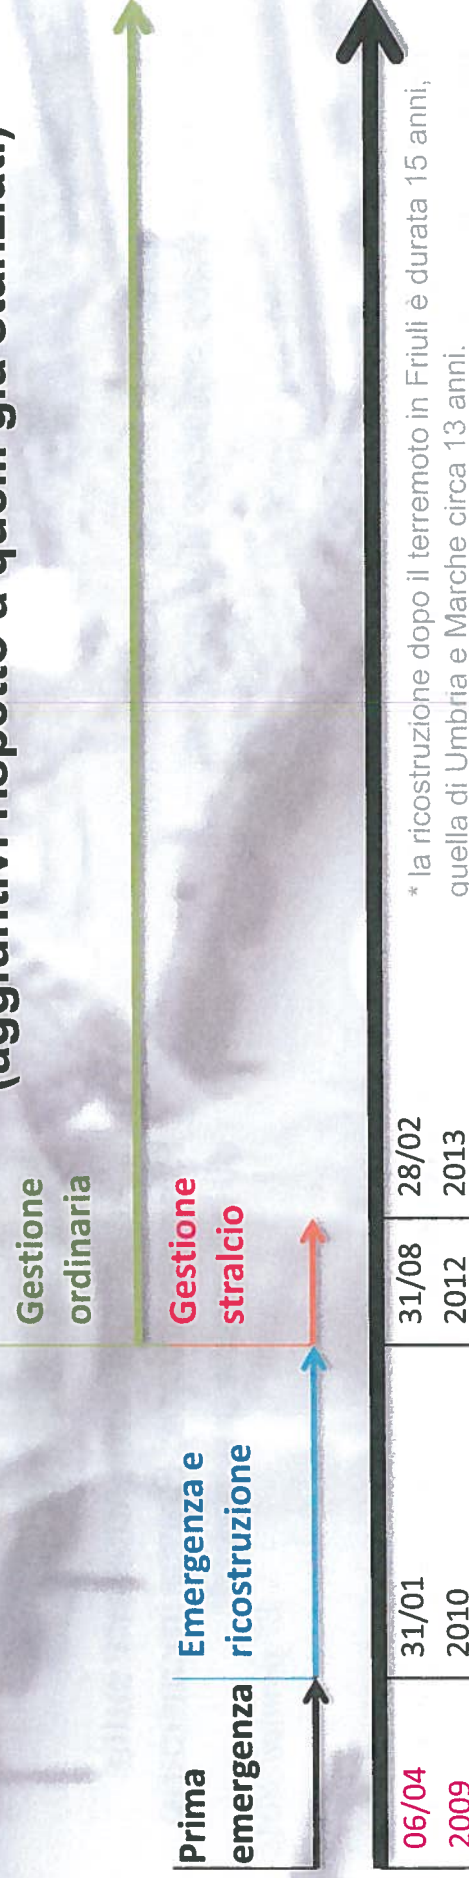

* la ricostruzione dopo il terremoto in Friuli è durata 15 anni,
quella di Umbria e Marche circa 13 anni.



Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la Coesione Territoriale

1. La ricostruzione: gennaio 2012 - marzo 2013

Il **27 Gennaio 2012** il Presidente del Consiglio dei Ministri conferisce al Ministro per la Coesione Territoriale l'incarico di integrare le iniziative volte allo sviluppo e all'accelerazione della ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere. Diverse le criticità riscontrate a quel tempo per l'avvio della ricostruzione.

Questi i titoli dei giornali di quel periodo:

CR13 Local
il Centro

**L'Aquila 30 mesi dopo il sisma
La ricostruzione è ferma al palo**
7 ottobre 2011

www.**abpuizzo24ore.it**

**La ricostruzione è ferma: mobilitazione
per immediato sblocco dei progetti**
13 gennaio 2012

www.**abpuizzo24ore.it**

**La ricostruzione aquilana ferma,
anzi in Intervallo...**
9 gennaio 2012

la Repubblica.it

**L'Aquila, Monti accelera sulla
Ricostruzione, Barca incaricato
di integrare interventi**
27 gennaio 2012

Il punto di vista della stampa nazionale differisce da quanto contenuto nel successivo documento OCSE, che ha ricondotto le difficoltà della ricostruzione al conflitto tra i soggetti responsabili e al mancato coinvolgimento della popolazione interessata dal sisma.



1. La ricostruzione: gennaio 2012 - marzo 2013

Febbraio 2012: attività preliminari alla definizione della strategia

Quadro storico-comparativo

Analisi delle attività svolte nella gestione della ricostruzione a seguito di recenti eventi sismici (Friuli, Irpinia, Umbria-Marche).



Mancanza di procedure unificate e trasparenti.
Assenza di un'adeguata informazione alla popolazione delle attività svolte.

Ricognizione e studio

Analisi delle esigenze della popolazione, degli iter amministrativi e comprensione dello stato di attuazione della ricostruzione



Avvio di specifiche indagini e studi, anche in collaborazione con l'OCSE e l'Università di Gröningen, e di progetti di sviluppo.



Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la Coesione Territoriale

1. La ricostruzione: gennaio 2012 - marzo 2013

Marzo 2012: il coinvolgimento della popolazione del cratere a L'Aquila

16 marzo 2012

Incontro “*Aspettando il forum...*” presso il Ridotto del Teatro Comunale tra gruppo di Ricerca OCSE e città dell'Aquila per la strategia di sviluppo del territorio.

17 marzo 2012

Presentazione presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso del rapporto OCSE - Università di Gröningen “*Abruzzo verso il 2030: sulle Ali dell'Aquila*”, redatto su mandato di Confindustria, CGIL, CISL e UIL

23 marzo 2012

Presentazione, presso la sede della Regione Abruzzo, del Dossier informativo “*La ricostruzione dei comuni del cratere aquilano*”, contenente un **prospetto riiepilogativo delle risorse finanziarie** finalizzate all'emergenza e alla ricostruzione, suddivise per fonte e destinazione.
Questa la sintesi del Dossier: stanziamenti per 10,6 miliardi di euro di cui 3,4 miliardi ancora non assegnati. Le spese totali già effettuate risultano pari a circa 3,5 miliardi di cui circa 2,8 miliardi per l'emergenza.



1. La ricostruzione: gennaio 2012 - marzo 2013

23 marzo 2012: OPCM 4013 di modifica del processo di ricostruzione per favorire l'avvio della gestione ordinaria

Informazione:

Fonti, destinazione e stato di attuazione delle risorse finanziarie investite per l'emergenza.

Comunicazione:

Pubblicazione in forma aperta – *open data* - di ogni atto o attività intrapresa per la ricostruzione.

Programmazione:

Previsioni annuali per ogni voce di spesa.

Semplificazione:

Snellimento delle Strutture Commissariali.
Primo trasferimento di competenze alle Amministrazioni ordinarie.
Procedure semplificate per le istruttorie.

Rigore:

White-list. Controlli *ex-ante* sulla regolarità e sulla qualificazione professionale degli attori della ricostruzione e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.



1. La ricostruzione: gennaio 2012 - marzo 2013

**Il percorso di approvazione delle nuove norme sulla ricostruzione:
gli incontri con la popolazione a L'Aquila**

12 giugno 2012

Tendone di Piazza Duomo, presentazione dello stato di avanzamento delle iniziative previste dall'OPCM 4013

15 giugno 2012

Dibattito pubblico in Piazza Duomo *"Ricostruzione: i prossimi passi"* e presentazione dei Rapporti:

- *"L'Aquila 2030" Una strategia di sviluppo economico*
- *Relazione urbanistica*
- *Relazione giuridica*

Tendone di Piazza Duomo: condivisione degli indirizzi di modifica del processo di ricostruzione.

17 giugno 2012

Tendone di Piazza Duomo: diretta streaming del dibattito pubblico *"Diamo voce all'Aquila"*



1. La ricostruzione: gennaio 2012 - marzo 2013

**Il percorso di approvazione delle nuove norme sulla ricostruzione:
le tappe istituzionali e l'iter normativo**

8 marzo 2012

Audizione del Ministro per la Coesione territoriale all'VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati sulle "iniziative per accelerare la ricostruzione del territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009.

26 giugno 2012

Il Consiglio dei Ministri approva il pacchetto di norme proposte dal Ministro per la Coesione territoriale, che disciplinano la chiusura dello stato di emergenza in Abruzzo e modificano la *governance* della ricostruzione.

2 luglio 2012

Incontro con gli Onorevoli abruzzesi per discutere dei contenuti e dell'iter di approvazione parlamentare delle nuove norme sulla ricostruzione.

3 agosto 2012

Approvazione delle nuove norme sulla ricostruzione in Abruzzo in sede di conversione del D.L. 83 del 2012 nella legge 143 del 2012.



Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la **Coesione Territoriale**

1. La ricostruzione: gennaio 2012 - marzo 2013

Le novità di metodo della legge - 1

Immediata fine dell'emergenza

L'emergenza in Abruzzo è durata molto meno di quella provocata dal terremoto in Umbria e Marche (circa 10 anni). L'immediata fine dell'emergenza risponde anche alle istanze della popolazione del cratere.

Gli Uffici speciali per la ricostruzione con *governance* innovativa

Per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con la garanzia del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, sono istituiti due Uffici Speciali per la ricostruzione: per L'Aquila e per i restati 56 Comuni del cratere, innovativa governance Centro-Comuni.



1. La ricostruzione: gennaio 2012 - marzo 2013

Le novità di metodo della legge - 2

Modifica e semplificazione dei criteri e delle modalità della ricostruzione.

Le priorità degli interventi sono state identificate nel rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, nel recupero e miglioramento antisismico degli edifici, nella promozione e riqualificazione dell'abitato. Il nuovo metodo prevede, inoltre, modalità parametriche per il riconoscimento dei contributi.

Concorso per 350 unità di personale di cui 300 a tempo indeterminato.

Constatata l'impossibilità di effettuare la ricostruzione con modalità di lavoro precario, è stato indetto un bando di concorso pubblico per la selezione di 350 unità di personale di cui 300 a tempo indeterminato, con una riserva pari al 50% dei posti messi a concorso a favore del personale precario già impegnato nella ricostruzione.

Costituzione di un primo nucleo permanente per la ricostruzione.

100 unità di personale a tempo indeterminato, selezionate tramite il concorso, costituiranno una task-force permanente con alta professionalità che, finita la ricostruzione in Abruzzo, potrà essere utilizzata in occasione di ulteriori eventi calamitosi.



Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la **Coesione Territoriale**

1. La ricostruzione: gennaio 2012 - marzo 2013

Attuazione della legge per la gestione ordinaria

7 agosto 2012

Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila.

9/10 agosto 2012

Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per i Comuni del cratere.

31 agosto 2012

Sottoscrizione dell'Intesa sul Piano di Ricostruzione della Città dell'Aquila. È un piano di dimensioni ed impatto macroeconomico per l'entità degli investimenti pubblici previsti: nel complesso 5.400 milioni di euro.

Avvio della selezione dei titolari dei due Uffici Speciali per la ricostruzione.

1 settembre 2012

Inizio della gestione ordinaria della ricostruzione in Abruzzo.



1. La ricostruzione: gennaio 2012 - marzo 2013

11 settembre 2012

Bando di concorso per l'assunzione di 300 unità a tempo indeterminato per gli Uffici Speciali per la ricostruzione e i Comuni del cratere (lo scorso 26 febbraio sono stati convocati all'Aquila i vincitori per la scelta delle sedi di lavoro).

4 ottobre 2012

Presentazione pubblica della Relazione finale del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo al Presidente del Consiglio dei Ministri.

12 ottobre 2012

Nomina dei titolari degli Uffici Speciali.

3 dicembre 2012

Bandi di concorso pubblico per 50 unità di personale a tempo determinato da impiegare negli Uffici Speciali.

4 febbraio 2013

Sottoscrizione del DPCM sulle modalità parametriche di definizione dei contributi per la ricostruzione.



Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la **Coesione Territoriale**

1. La ricostruzione: gennaio 2012 - marzo 2013

Il confronto pubblico: principali incontri

27 settembre 2012

Auditorium Carispaq dell'Aquila, presentazione e discussione del Rapporto *“L'Aquila 2030. Lineamenti di un piano di Sviluppo e Coesione”*.

4 dicembre 2012

Forum OCSE a Parigi con Confindustria, CGIL, CISL e UIL *“On the wings of L'Aquila: Abruzzo 2030”*.

1 marzo 2013

Forum OCSE - Università di Gröningen all'Aquila *“L'azione delle politiche a seguito di disastri naturali: aiutare le regioni a sviluppare resilienza. Il caso dell'Abruzzo post-terremoto”*. Un primo passo verso il programma 2014-2020 per l'Abruzzo.



1. La ricostruzione: gennaio 2012 - marzo 2013

AVVIO DELLA NUOVA
FASE: GESTIONE
ORDINARIA

13 settembre
Decreto del DiSET di assegnazione temporanea del personale non apicale operante nell'area del cratere agli enti e alle amministrazioni locali e statali.

10 ottobre
Nomina, fino al 31 dicembre, del Capo del DiSET quale titolare della Gestione Stralcio della contabilità speciale, prima intestata al Commissario delegato per la ricostruzione (somme da gestire pari a 447 milioni di euro).

3 dicembre
Riparto delle risorse (345 milioni di euro) disponibili per la ricostruzione privata (63% Aquila e 37% Cratere + 10 milioni di euro agli altri Comuni).

21 dicembre
DPCM di proroga della gestione stralcio fino al 28 febbraio 2013.

Riparto con delibera CIPE di 2.245 milioni di euro provenienti dal Decreto Legge 39/2009 convertito con Legge 77/2009.

29 gennaio
Trasferimento di 189 milioni di euro (delibera CIPE 43/2012).

28 Febbraio
Fine della gestione stralcio.

2012

11 settembre
Pubblicazione dei 14 bandi di concorso per 300 unità di personale a tempo indeterminato da impiegare nella ricostruzione.

4 ottobre
Presentazione pubblica della Relazione finale del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo al Presidente del Consiglio dei Ministri.

12 ottobre
Nomina dei titolari degli Uffici Speciali.

3 dicembre
Pubblicazione di 2 bandi di concorso pubblico per 50 unità di personale a tempo determinato da impiegare negli Uffici speciali.

4 febbraio
Sottoscrizione del DPCM sulle modalità parametriche di definizione dei contributi per la ricostruzione.

25 febbraio
Sottoscrizione dei contratti dei due coordinatori degli Uffici Speciali.

2013



Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la Coesione Territoriale

2. L'avvio degli Uffici Speciali per la ricostruzione



2. L'avvio degli Uffici Speciali per la ricostruzione

Gli Uffici Speciali per la ricostruzione

L'articolo 67 ter, comma 2, del decreto-legge 83 del 22 giugno, convertito in legge 134 del 7 agosto 2012, istituisce gli Uffici Speciali per la ricostruzione

USRA

per la Città dell'Aquila



7 agosto 2012 - **INTESA**: viene determinata l'organizzazione, la struttura, la durata, i compiti, i rapporti con i livelli istituzionali, la dotazione di risorse umane e strumentali dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila.



31 gennaio 2013 è pubblicato il regolamento dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila con cui sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio.

USRC

per i Comuni del Cratere



9/10 agosto 2012 - **INTESA**: viene determinata l'organizzazione, la struttura, la durata, i compiti, i rapporti con i livelli istituzionali, la dotazione di risorse umane e strumentali dell'Ufficio Speciale per i Comuni del cratere.





7 febbraio 2013 è pubblicato il regolamento dell'Ufficio Speciale per i Comuni del cratere con cui sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio.



2. L'avvio degli Uffici Speciali per la ricostruzione

L'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila – USRA
Regolamento di organizzazione e funzionamento

La struttura

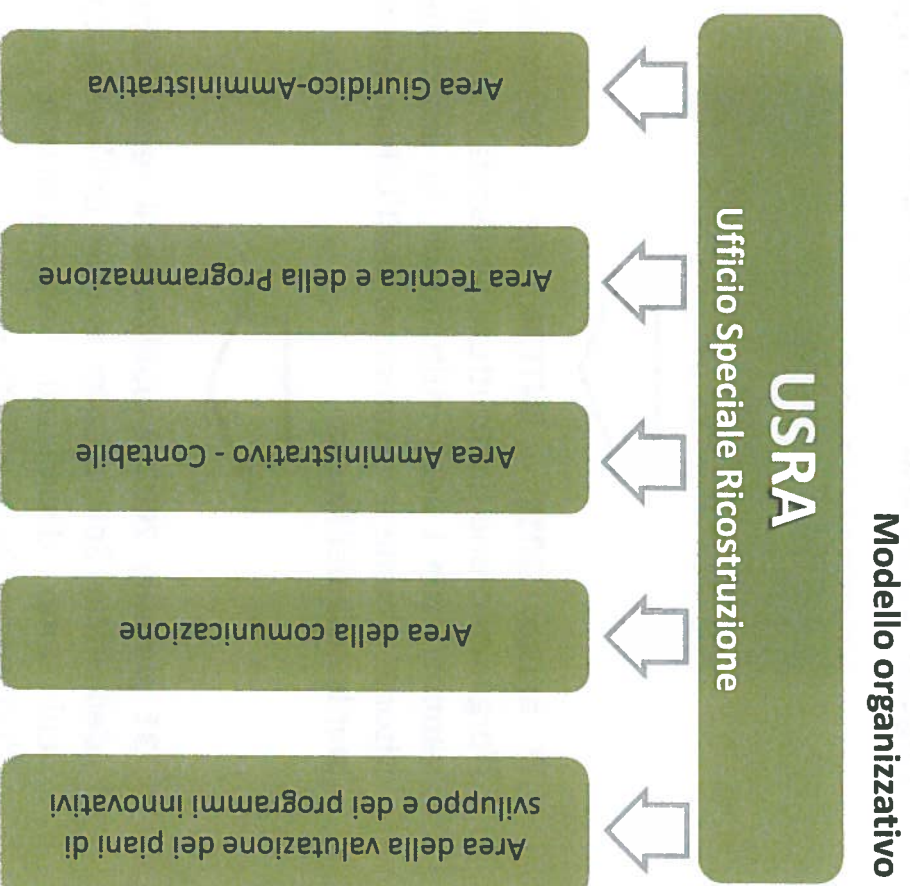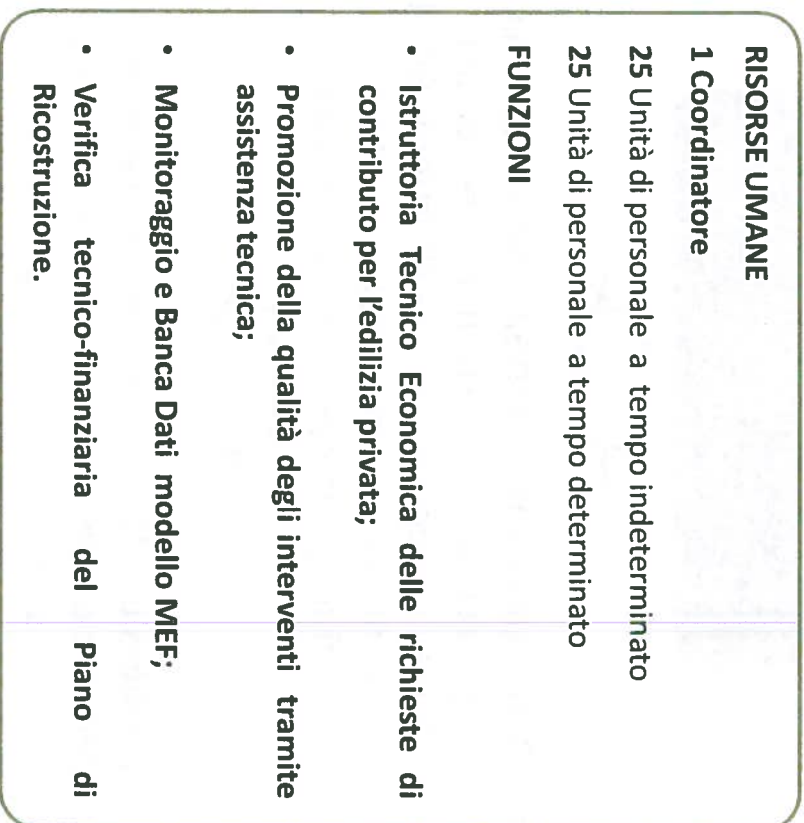




2. L'avvio degli Uffici Speciali per la ricostruzione

IL PROGETTO BANCHE DATI (Determinazione n. 5 del 14 marzo 2013)

Al fine di dare attuazione ai principi di trasparenza, fruibilità dell'informazione e partecipazione delle istituzioni e della cittadinanza, è in corso di implementazione la gestione.

Partecipanti: Comune / SED
Banche dati emergenza,
Università, CNR, Regione, Filiera.
Sistema di georeferenziazione
delle pratiche.

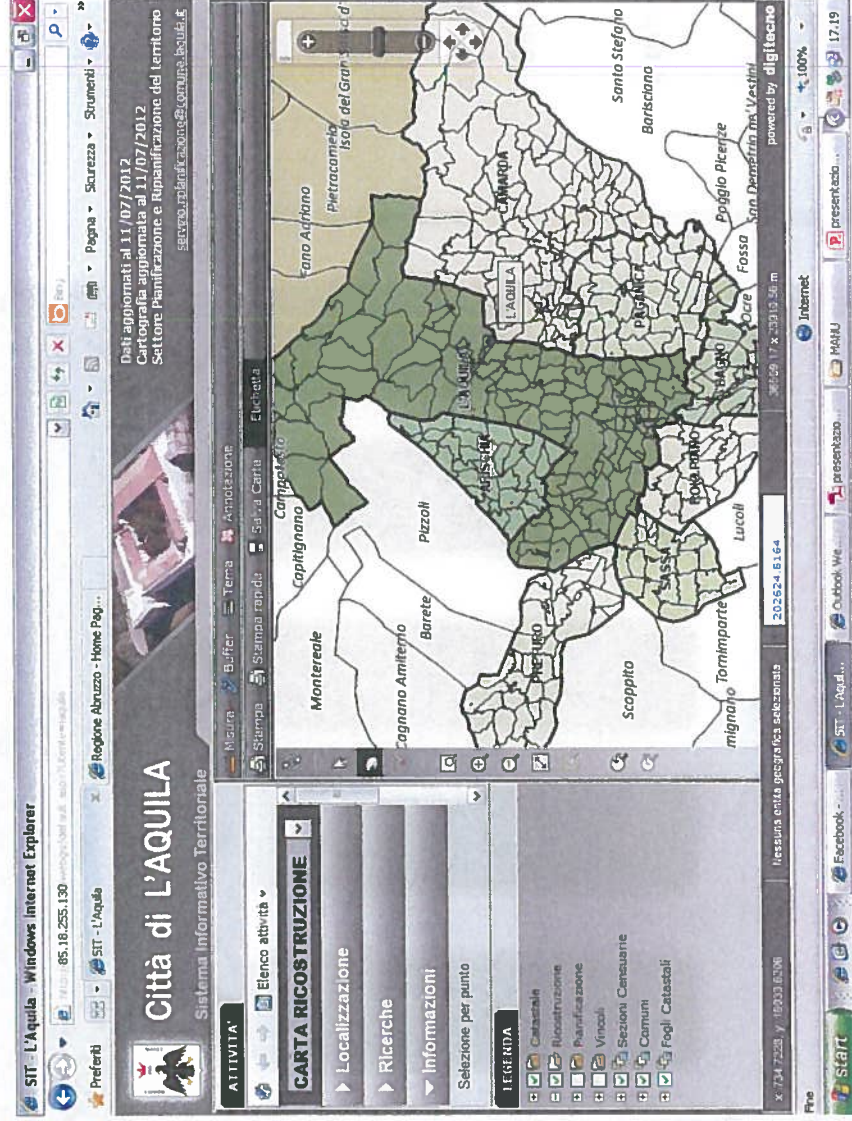




Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la Coesione Territoriale

2. L'avvio degli Uffici Speciali per la ricostruzione

L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere – USRC
Regolamento di organizzazione e funzionamento



Sito web <http://www.comunedifossa.it/Usrcc/USRCC.aspx>

La struttura

RISORSE UMANE


1 Coordinatore

25 Unità di personale a tempo indeterminato

25 Unità di personale a tempo determinato

FUNZIONI

- Coordinamento degli UTR e supporto ai comuni
- Istruttoria Tecnico Economica Pdr
- Monitoraggio e Banca Dati modello MEF
- Piani di Sviluppo

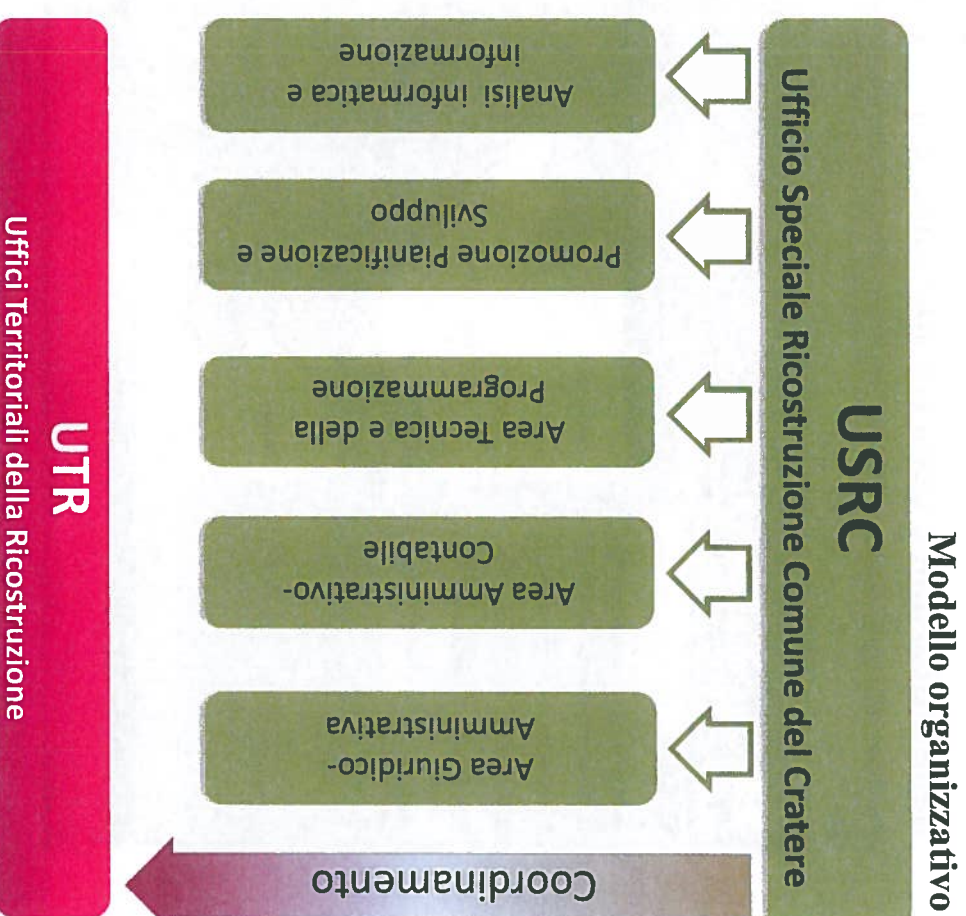



2. L'avvio degli Uffici Speciali per la ricostruzione

Gli Uffici Territoriali della Ricostruzione - UTR

Sono istituiti gli Uffici Territoriali della ricostruzione UTR presso i Comuni "capo fila", fanno eccezione AO2 e AO6.

- AO2 Campotosto – (UTR a Barette)
- AO3 Montorio al Vomano (TE)
- AO4 Castel Del Monte
- AO5 Bussi sul Tirino (PE)
- AO6 Prata D'Ansondia – (UTR a Caporciano)
- AO7 Goriano Sicoli
- AO8 Barisciano
- AO9 Rocca di Mezzo

UTR

Uffici Territoriali della Ricostruzione



* comuni fuori dai crateri

La struttura

RISORSE UMANE

72 unità di personale a tempo indeterminato suddivise secondo Accordo, organizzati su **Convenzioni** tra Comuni Area Omogenea e tramite **Regolamenti Interni**


FUNZIONI

- Filiera Pratiche Edilizia Privata
- Rapporti con territorio
- Comuni oltre cratere : **Governance da implementare**



2. L'avvio degli Uffici Speciali per la ricostruzione

I piani di ricostruzione nei Comuni del Cratere (escluso L'Aquila)

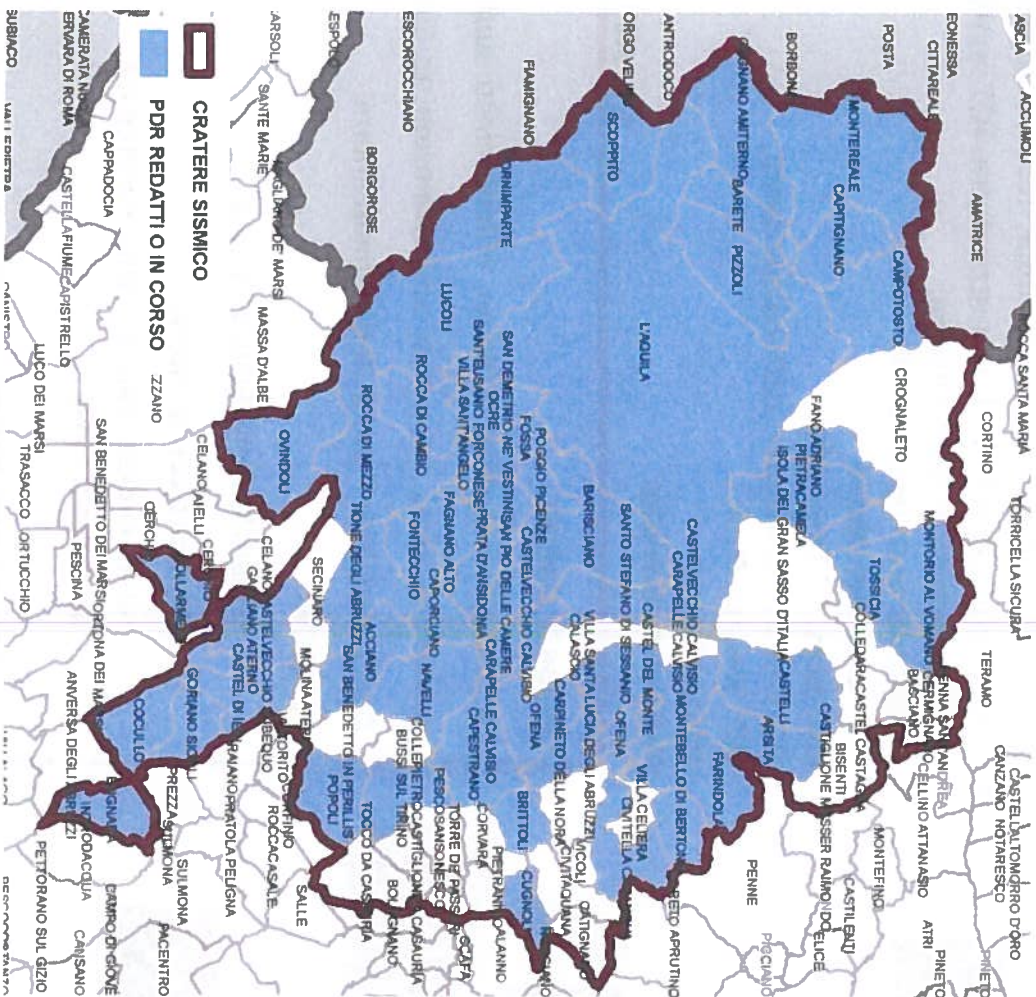


PDR redatti o in corso di predisposizione

56 COMUNI

alla data del 12 marzo 2013

Piani di ricostruzione	Numero
PDR adottati	29
PDR predisposti	14
PDR ad intesa	13

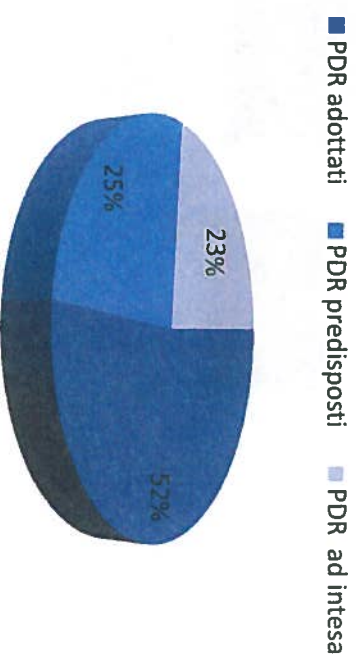




Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la Coesione Territoriale

3. Le risorse finanziarie



3. Le risorse finanziarie

Programmazione e gestione risorse finanziarie ricostruzione: marzo 2012 - marzo 2013

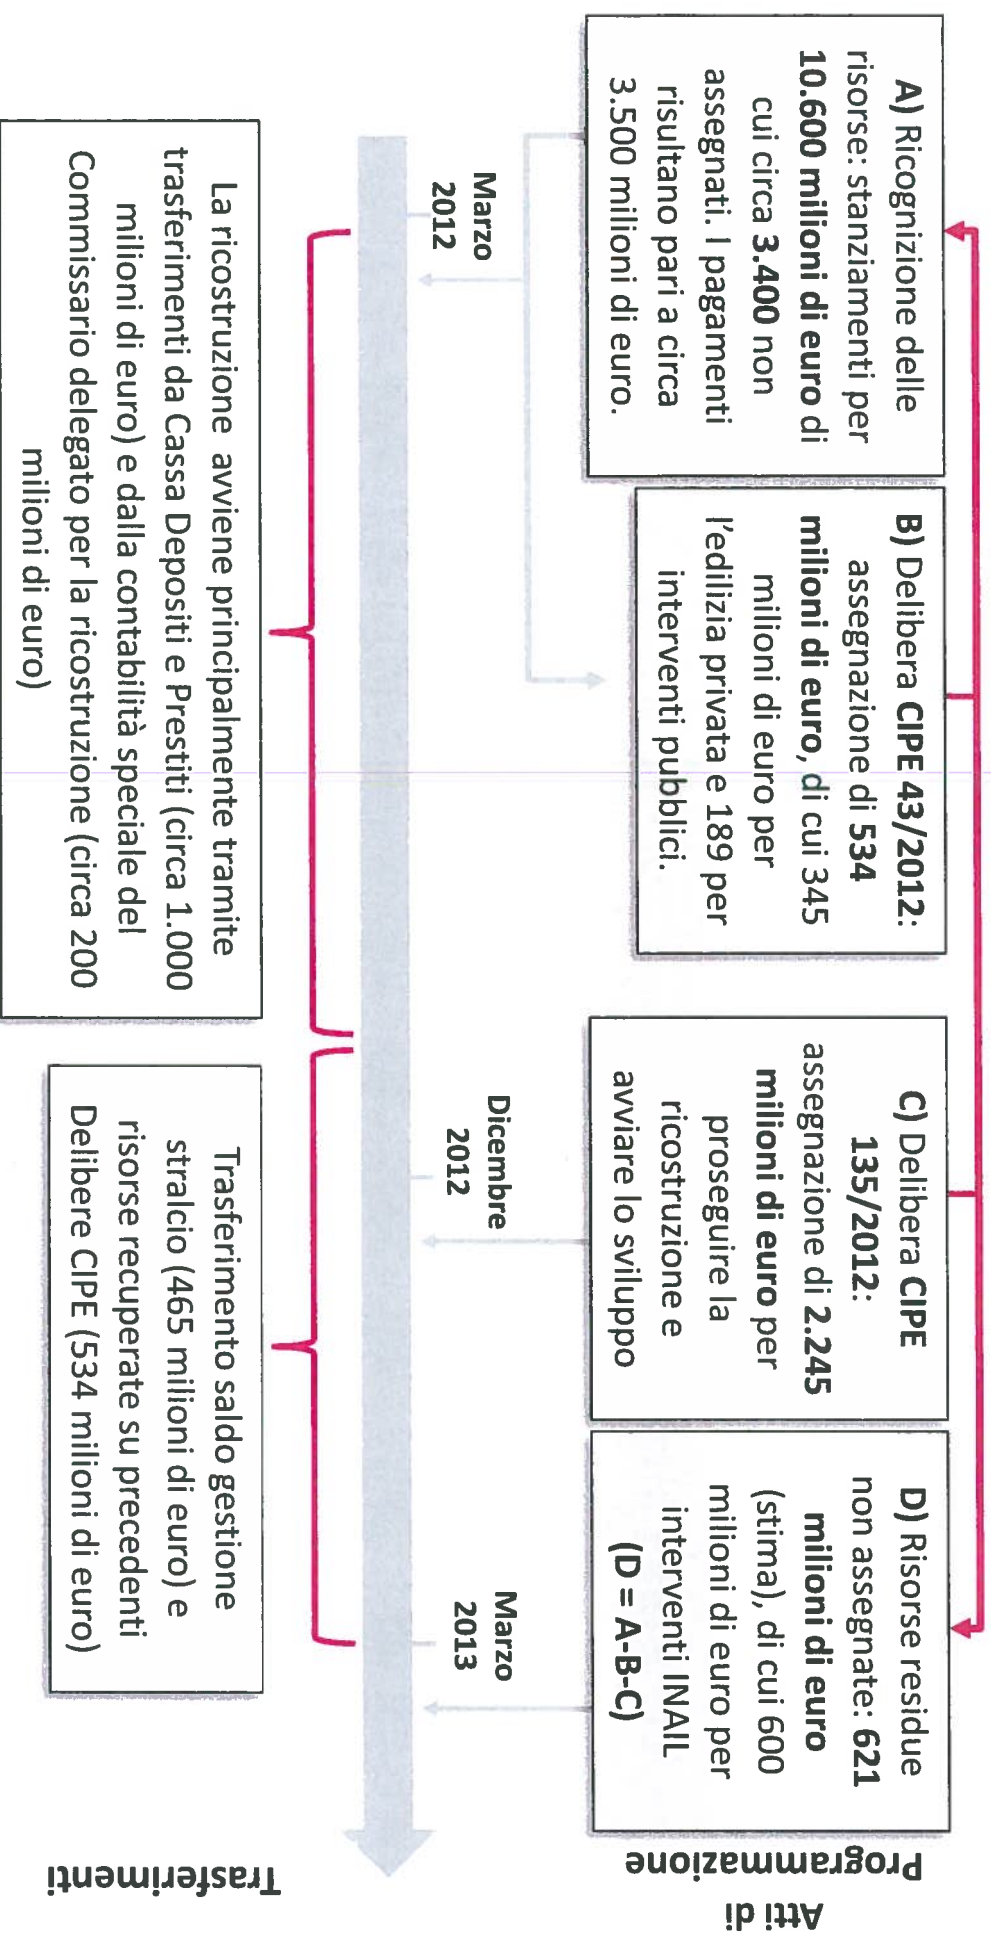



3. Le risorse finanziarie

Dettaglio assegnazioni CIPE (Delibera 43 marzo 2012) e successivi trasferimenti –
189 milioni di euro - INTERVENTI PUBBLICI

Intervento	Beneficiario	Importo (in milioni di euro)
Interventi vari nelle 6 “aree a breve” - Ambito B - della città di L’Aquila	Comune di L’Aquila	3
	Provveditorato	
	Comune di L’Aquila	47,1
Edilizia pubblica del centro storico di L’Aquila	Dir. Reg. BB.CC.	
	Dir. Reg. BB.CC.	9,1
Mura Urbiche e Chiesa di Santa Maria del Soccorso	G.S.A.	27,15
Interventi sulle reti e gli impianti nella città di L’Aquila	A.T.O. n.1	2,9
Interventi sulle reti dei Comuni di Capitignano e Cagnano Amiterno	Ufficio scolastico regionale	5,8
Avvio anno scolastico 2012 – 2013 (ampliamento offerta formativa, tempo pieno e prolungato, manutenzione MUSP ecc.)	Regione Abruzzo	43,8
Ripresa attività produttive (PMI e grandi imprese che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli a causa del sisma)	Dir. Reg. BB.CC.	14,2
Messa in sicurezza edifici di culto	Provveditorato	6,7
Tribunale del Comune di Chieti	Comune di L’Aquila	0,6
Prevenzione contro il dissesto idrogeologico e Fontana 99 cannelle	ATER L’Aquila	29
Edilizia residenziale pubblica		



3. Le risorse finanziarie

Dettaglio assegnazioni CIPE (Delibera 43, marzo 2012) e successivi trasferimenti - 345 milioni di euro – EDILIZIA PRIVATA

EDILIZIA PRIVATA	Millioni di euro
L' Aquila	211
56 Comuni del Cratere	124
Comuni Fuori cratere	10
TOTALE Trasferito	345



3. Le risorse finanziarie

Dettaglio assegnazioni CIPE (Delibera 135, dicembre 2012) - 2.245 milioni di euro
EDILIZIA PRIVATA, EDILIZIA PUBBLICA, SVILUPPO E INTERVENTI VARI

Finalizzazione	Milioni di euro	Milioni di euro
Edilizia Privata di L'Aquila		985
periferie	410	
centro storico	575	
Edilizia Privata dei 56 Comuni del Cratere		460
periferie	256	
centro storico	204	
Edilizia pubblica		450
Edilizia pubblica di L'Aquila	262	
Edilizia pubblica dei 56 Comuni del Cratere	188	
Edilizia privata e pubblica dei Comuni fuori Cratere		55
Interventi per lo sviluppo		100
Spese per popolazione, emergenze e altre necessità		180
Assistenza tecnica		15
Totale generale		2.245




3. Le risorse finanziarie

Trasferimenti della gestione stralcio dal 10 ottobre 2012 al 28 febbraio 2013

Totale trasferito
464,7 milioni di euro


Focus
In circa 5 mesi di operatività sono stati emessi 1.049 ordinativi di pagamento per 464,7 milioni di euro: una media, festivi inclusi, di 7 ordinativi e 3,1 milioni di euro circa al giorno.

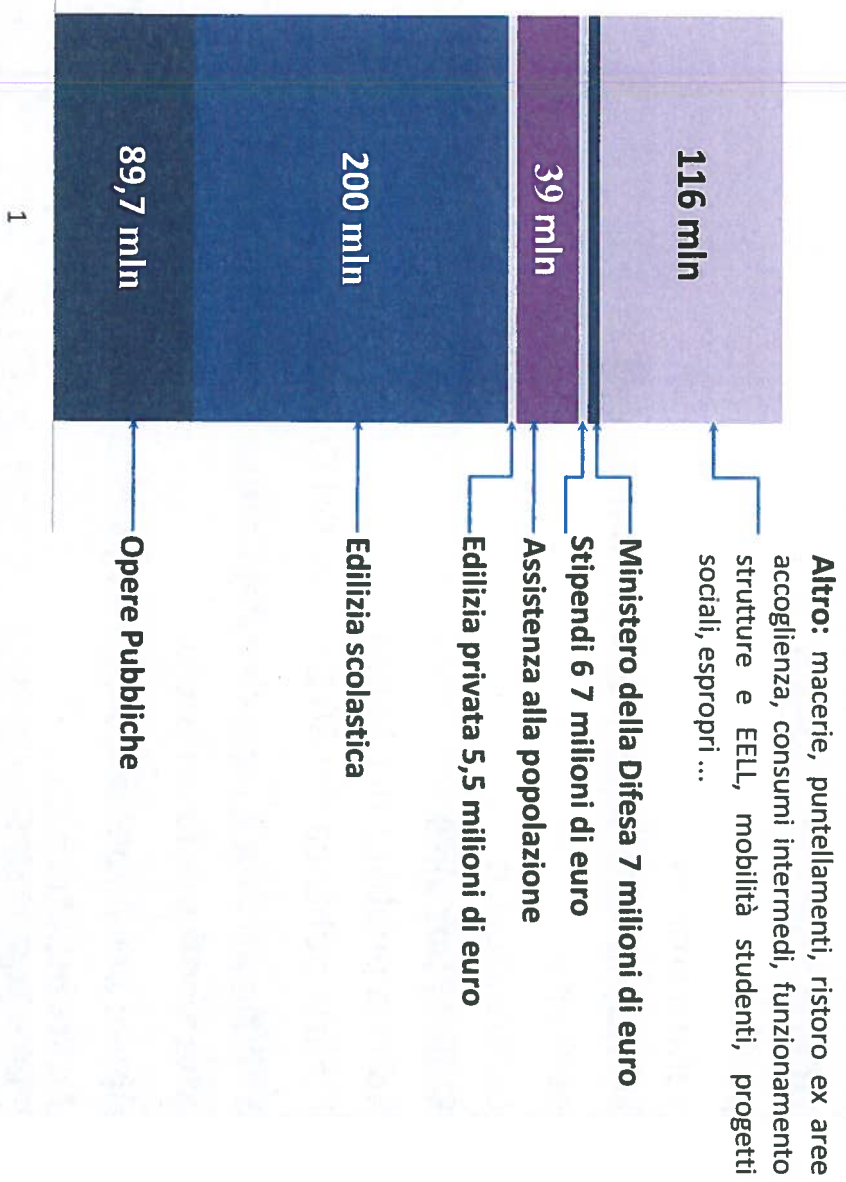



3. Le risorse finanziarie

Trasferimenti per la ricostruzione privata tramite canale C.DD.PP. - Cratere abruzzese

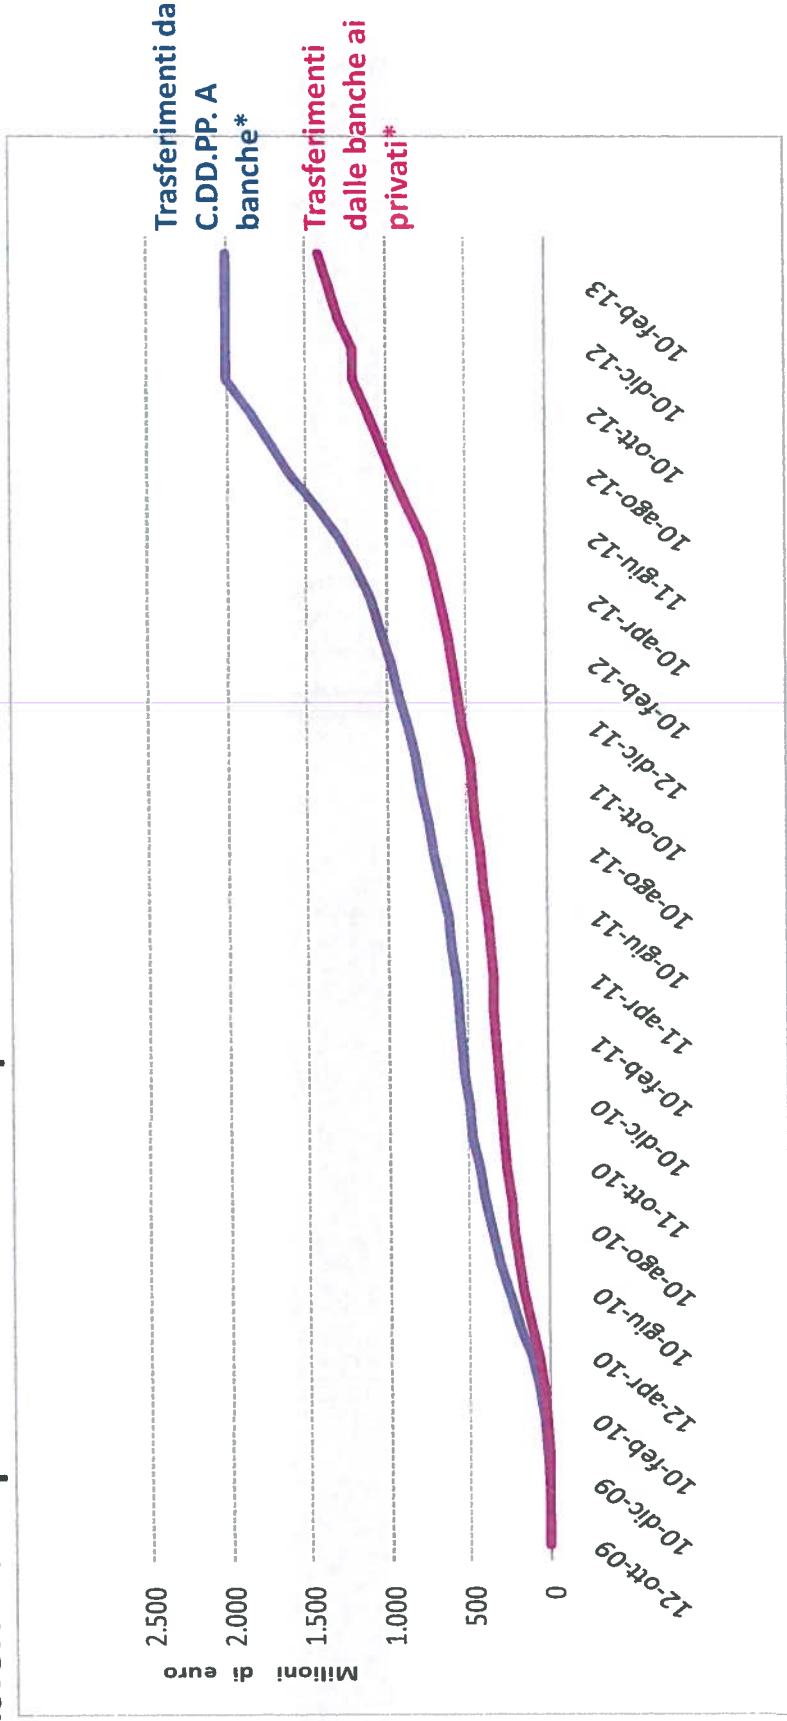

Il finanziamento tramite C.DD.PP. ha riguardato gli edifici con esito B, C ed E, classificati secondo le schede AeDES (B= temporaneamente inagibili, C= parzialmente inagibile, E= inagibile)

*Plafond C.DD.PP.: 2.000 milioni di euro, esaurito a ottobre 2012

*dato stimato



Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la Coesione Territoriale

4. Lo stato d'attuazione



4. Lo stato di attuazione

Rientri a casa




Aggiornamento al marzo 2013
(**) dato stimato



4. Lo stato di attuazione


EDILIZIA PRIVATA - Comune dell'Aquila - Immobili con esito «E» periferie e centri storici

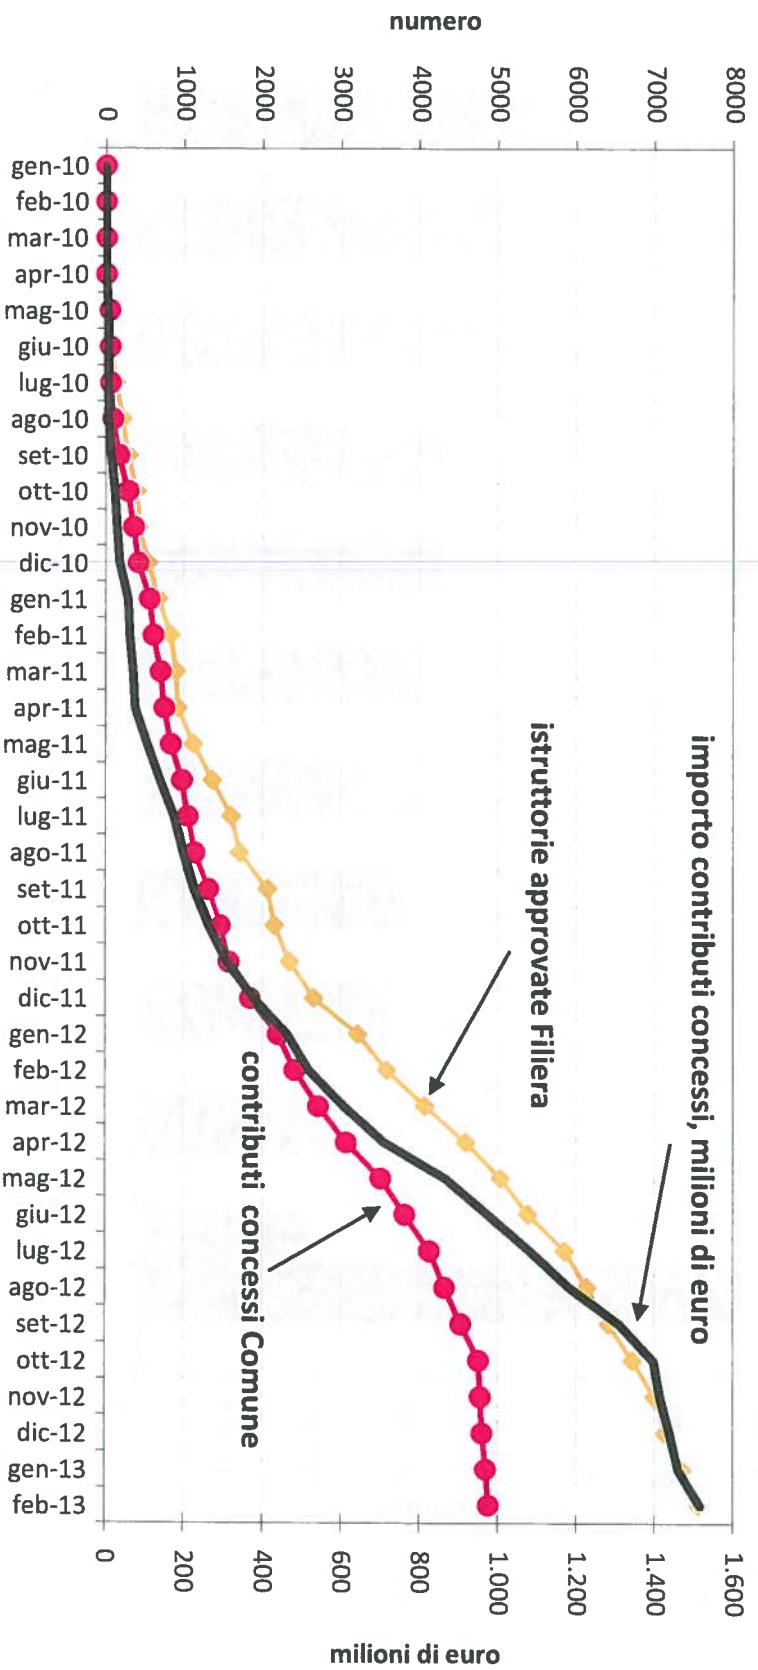



4. Lo stato di attuazione

EDILIZIA PRIVATA - Comune dell'Aquila – Cantieri aperti immobili con esito «E»: periferie e centri storici

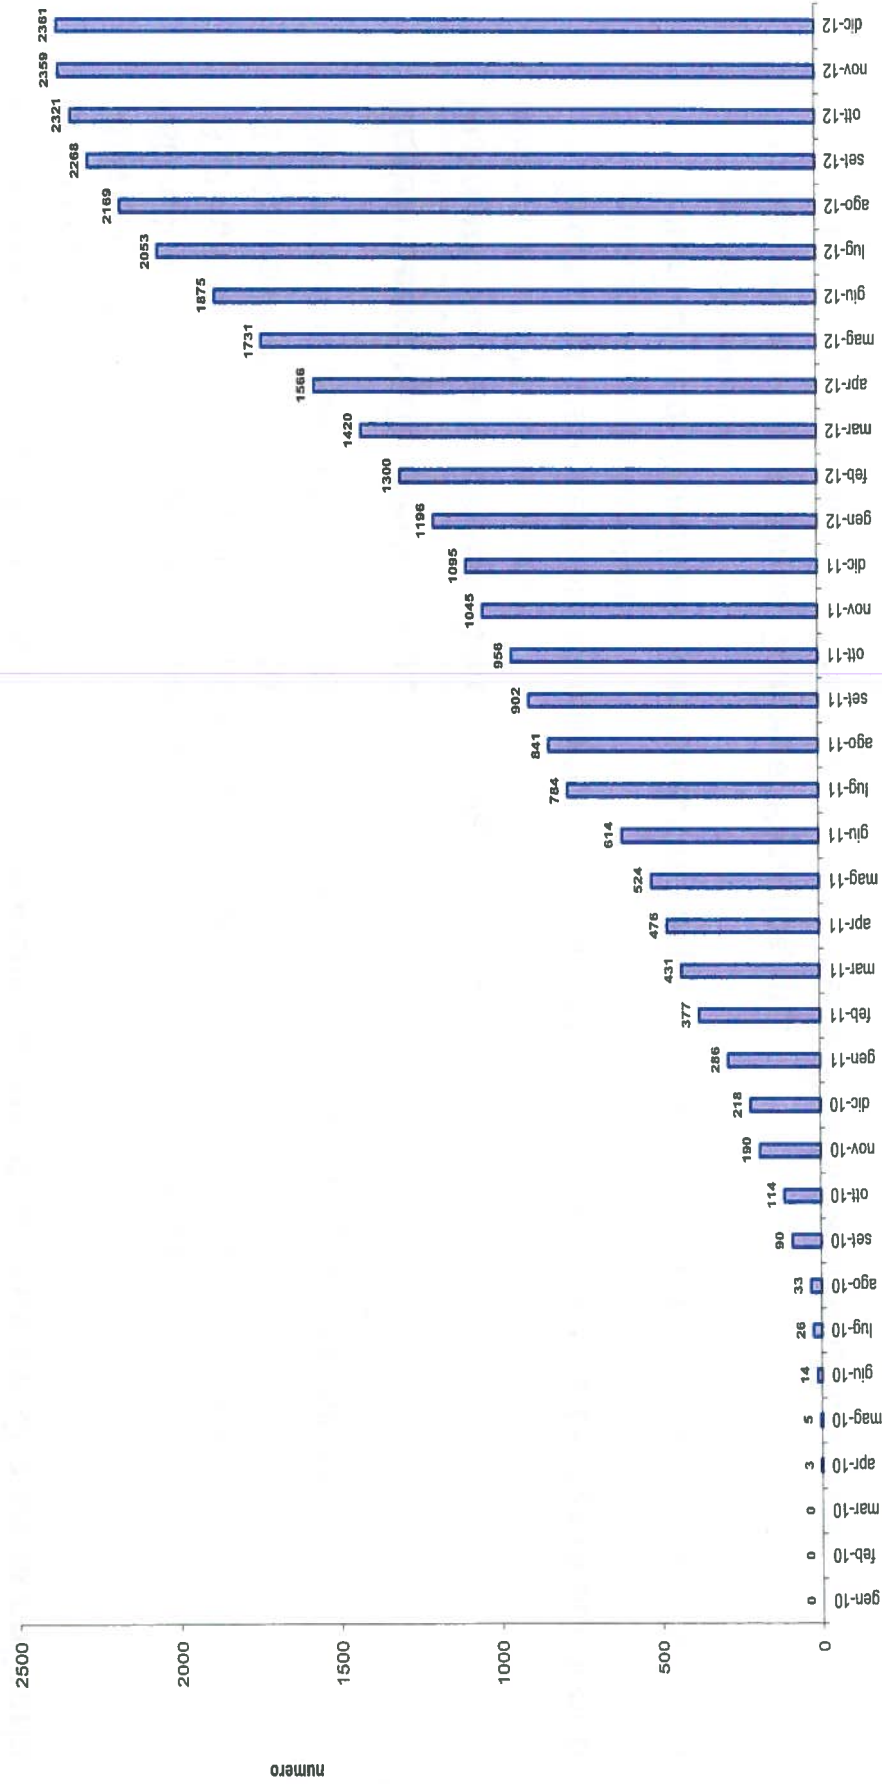

Dato mensile cumulato



4. Lo stato di attuazione

EDILIZIA PRIVATA - Comune dell'Aquila - Delibera CIPE 135 del dicembre 2012

Periferie: 410 milioni di euro

Il riavvio della ricostruzione della periferia avviene utilizzando un criterio di priorità ordinaria (cronologico)

Situazione attuale

- 80 milioni di euro: importo dei contributi riconosciuti ma non erogati;
- 310 milioni di euro: importo dei contributi delle pratiche istruite positivamente;
- 3.400 pratiche in corso di istruttoria ;
- 900 milioni di euro: importo totale stimato dell'ulteriore fabbisogno finanziario.

Centro storico: 575 milioni euro

La ricostruzione avviene sulla base dei seguenti criteri:

Priorità alta (70% delle risorse)

- Capoluogo: Asse centrale e progetti unitari ambito B; aggregati con presenza di porzioni o unità strutturali vincolate.

Criteri di individuazione: cantierabilità degli interventi; coordinamento tra interventi pubblici e privati.

- Frazioni prioritarie (Onna, Tempera, Paganica, etc.).

Criteri di individuazione: rilievo macrosismico; esiti di agibilità; densità abitativa.

Priorità ordinaria (30% delle risorse)

- Capoluogo: centro storico fuori Asse centrale
- Restanti frazioni.



4. Lo stato di attuazione

EDILIZIA PRIVATA - Comune dell'Aquila. Nuova procedura per l'erogazione dei contributi - Convenzione ABI*

Il Comune accredita il contributo per la ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato su un conto corrente infruttifero.

Sono previste due modalità di trasferimento delle risorse:

A) Progetti presentati con la scheda parametrica - 3 rate:

- I) 2% del contributo - rimborso per spese tecniche
- II) 44% del contributo
- III) 44% del contributo

B) Progetti presentati con la vecchia procedura - 2 rate:

- I) 46% del contributo
- II) 44% del contributo

Il **saldo** (10%), in entrambi i casi, avviene successivamente alla verifica da parte del Comune della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori.

* E' prevista la possibilità di estendere questa convenzione agli altri 56 Comuni del Cratere.



4. Lo stato di attuazione

EDILIZIA PRIVATA – 56 comuni del cratere - Delibera CIPE 135 del dicembre 2012

Periferie: 256 milioni di euro

Il 60% di questo importo è assegnato figurativamente e in modo uniforme a tutti i 56 Comuni del cratere. Il trasferimento delle risorse ai Comuni è effettuato dagli 8 Uffici territoriali (UTR) sulla base delle effettive esigenze.

L'ulteriore 40% è assegnato ai Comuni proporzionalmente alla stima dei danni rilevati (esito "E").

Centri storici: 204 milioni di euro


Il criterio di riparto delle risorse per avviare la ricostruzione dei centri storici prevede che il trasferimento sia effettuato dagli 8 Uffici territoriali sulla base delle effettive esigenze dei Comuni.




4. Lo stato di attuazione

Interventi pubblici - Comune dell'Aquila*

Numero interventi

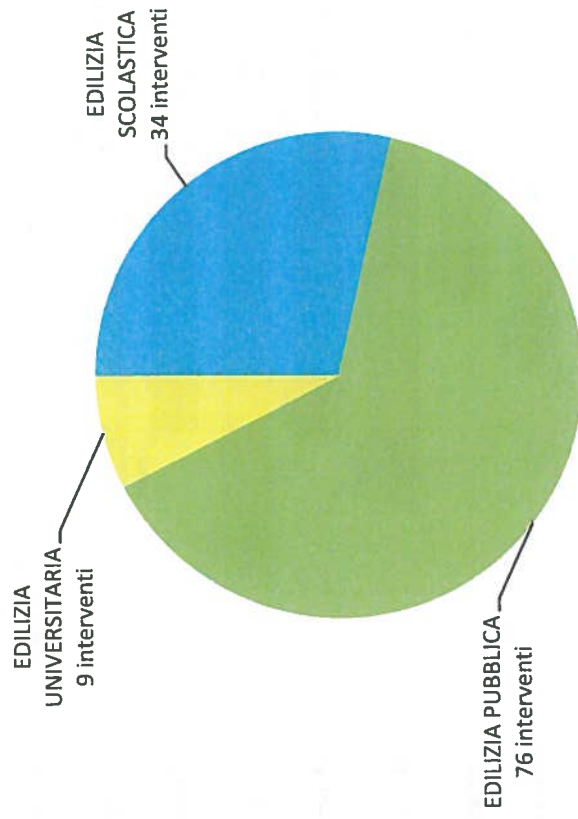

Importi

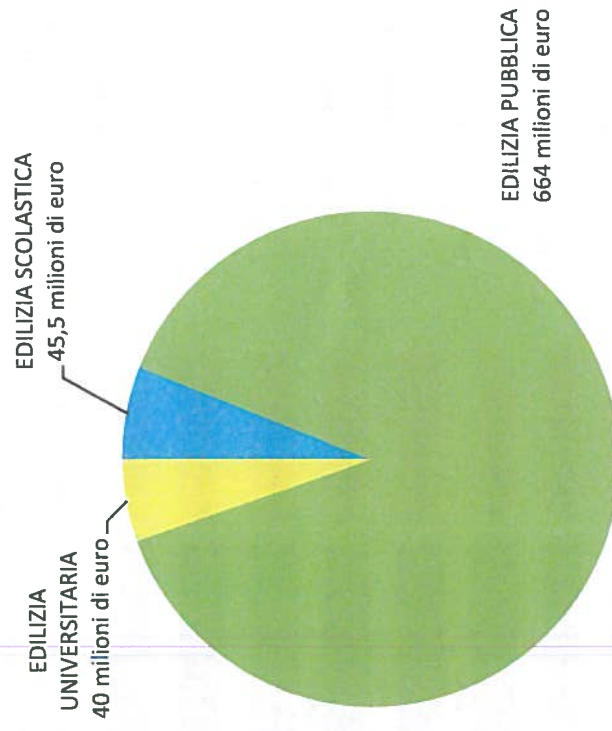

* Al netto degli interventi della Direzione Regionale BB.CC. Rielaborazioni di informazioni contenute in Delibere, Decreti e OPCM (dati soggetti a verifica)



4. Lo stato di attuazione

Focus su alcuni interventi pubblici di particolare importanza e in progettazione – Programmazione ante Delibera CIPE 135 dicembre 2012


INTERVENTO	IMPORTO	TEMPI RESIDUI TOTALI						
1. EX PALAZZO DEL LITTORIO - VIA SASSA, 5	€ 10.530.000,00	Progettazione 18 mesi	Gara d'appalto 9 mesi	Tempi di lavorazione dalla consegna 27 mesi	collaudo 2 mesi	collaudo 25 mesi	collaudo 2 mesi	38 mesi
2. EX MONASTERO SANTA CATERINA DA SIENA - VIA SASSA	€ 7.312.500,00	Progettazione e Gara d'appalto 11 mesi	Gara d'appalto 8 mesi	Tempi di lavorazione dalla consegna 24 mesi	collaudo 2 mesi	collaudo 27 mesi	collaudo 2 mesi	45 mesi
3. EX CONVENTO DI SANTA TERESA - VIA ROMA, 64	€ 10.101.000,00	Progettazione e Gara d'appalto 11 mesi	Gara d'appalto 8 mesi	Tempi di lavorazione dalla consegna 24 mesi	collaudo 2 mesi	collaudo 27 mesi	collaudo 2 mesi	40 mesi
4. PALAZZO MARGHERITA – PIAZZA PALAZZO	€ 11.700.000,00	Progettazione 8 mesi	Gara d'appalto 6 mesi	Tempi di lavorazione dalla consegna 24 mesi	collaudo 2 mesi	collaudo 24 mesi	collaudo 2 mesi	34 mesi
5. SCUOLA DE AMIGIS - PIAZZA DEL TEATRO	€ 16.575.000,00	Progettazione 8 mesi	Gara d'appalto 8 mesi	Tempi di lavorazione e dalla consegna 26 mesi	collaudo 2 mesi	collaudo 25 mesi	collaudo 2 mesi	32 mesi
6. EX LICEO SCIENTIFICO - VIA MAIELLA	€ 5.824.000,00	Progettazione 8 mesi	Gara d'appalto 8 mesi	Tempi di lavorazione dalla consegna 22 mesi	collaudo 2 mesi	collaudo 25 mesi	collaudo 2 mesi	36 mesi
7. TEATRO S. FILIPPO – VIA CAVOUR	€ 2.405.000,00	Progettazione 10 mesi	Gara d'appalto 10 mesi	Tempi di lavorazione dalla consegna 28 mesi	collaudo 2 mesi	collaudo 28 mesi	collaudo 2 mesi	32 mesi
8. TEATRO COMUNALE - PIAZZA DEL TEATRO	€ 12.675.000,00	Progettazione 8 mesi	Gara d'appalto 8 mesi	Tempi di lavorazione dalla consegna 14 mesi	collaudo 2 mesi	collaudo 14 mesi	collaudo 2 mesi	40 mesi
9. MUSEO SIGNORINI-CORSI – VIA PATINI, 42	€ 650.000,00	Progettazione 6 mesi	Gara d'appalto 6 mesi	Tempi di lavorazione dalla consegna 14 mesi	collaudo 2 mesi	collaudo 14 mesi	collaudo 2 mesi	24 mesi
10. CINEMA MASSIMO - CORSO FEDERICO II	€ 1.542.000,00	Progettazione 6 mesi	Gara d'appalto 6 mesi	Tempi di lavorazione dalla consegna 12 mesi	collaudo 2 mesi	collaudo 12 mesi	collaudo 2 mesi	22 mesi
11. RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE - PIAZZA DEL TEATRO	€ 416.000,00	Progettazione 6 mesi	Gara d'appalto 6 mesi	Tempi di lavorazione dalla consegna 10 mesi	collaudo 2 mesi	collaudo 10 mesi	collaudo 2 mesi	20 mesi
12. FRANA COLLINA BELVEDERE	€ 1.265.616,14	Progettazione 8 mesi	Gara d'appalto 8 mesi	Tempi di lavorazione dalla consegna 4 mesi	collaudo 2 mesi	collaudo 4 mesi	collaudo 2 mesi	12 mesi
13. MURA URBICHE COMPRESSE TRA PORTA RIVERA E STAZIONE FERROVIARIA	€ 800.000,00	Progettazione 8 mesi	Gara d'appalto 8 mesi	Tempi di lavorazione dalla consegna 12 mesi	collaudo 2 mesi	collaudo 12 mesi	collaudo 2 mesi	6 mesi
14. PONTE DI S. APOLLONIA	€ 1.200.000,00	Progettazione 8 mesi	Gara d'appalto 8 mesi	Tempi di lavorazione dalla consegna 12 mesi	collaudo 2 mesi	collaudo 12 mesi	collaudo 2 mesi	22 mesi



4. Lo stato di attuazione

Focus Interventi pubblici nel Comune dell'Aquila- Programmazione Delibera CIPE 135 del dicembre 2012

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Assegnazione Milioni di euro
1 EDILIZIA CIMITERIALE	6,63
2 EDILIZIA SCOLASTICA	6,39
3 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP	10,29
4 ALTRI INTERVENTI	51,30
• Accademia Internazionale dell' Immagine	6,00
• Ex ONPI	3,00
• Palazzetto dello Sport	2,00
• Recupero palazzina ex Finmek	1,70
• Recupero sedi Istit. Cons.Regionale	7,80
• Istituto S. Maria degli Angeli	3,50
• San Domenico	2,00
• San Bernardino	15,00
• Scuola media Mazzini	7,50
• Camera di Commercio	2,80
5 PROGETTI STRATEGICI	130,40
• Interventi di riqualificazione nell'ambito di progetti unitari	10,00
• Ricostruzione reti sottoservizi	52,90
• Site preparation, grid, communication network, rete sensori, control room, sistemi di gestione	17,50
• Spazi pubblici e rete viaria	15,00
• Sede unica del Comune	35,00
TOTALE	205,00

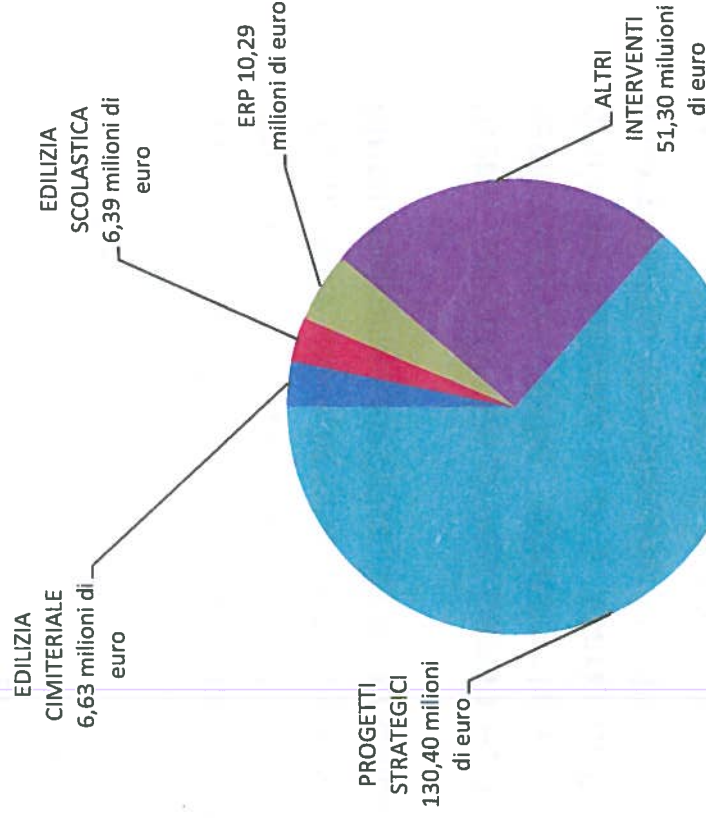



4. Lo stato di attuazione

Focus Sottoservizi. Comune dell'Aquila

Mancanza di coordinamento nella progettazione e gestione dei servizi sotterranei delle reti tecnologiche.

Alla fine del 2012 si è formulato un progetto unitario per il Centro storico che prevede il rifacimento complessivo del sistema delle reti idrica, fognaria, elettrica, telecomunicazioni, gas.

Viene lanciato un primo bando europeo per la realizzazione delle infrastrutture nelle zone dell'Asse Centrale e di S. Maria di Farfa per un investimento complessivo di circa 33 milioni di euro e la copertura di quasi il 40% dell'area del centro storico.





4. Lo stato di attuazione

Focus Sottoservizi. Comune di L'Aquila

Il progetto “L’infrastruttura Smart Grids per L’Aquila” in collaborazione con Enel Distribuzione:

- prevede interventi nel settore delle Smart Grids, **abilitando nel contempo alla realizzazione di misure per la fornitura di servizi innovativi ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione;**
- consente, grazie al ruolo “Abilitatore” di nuovi servizi proprio delle Smart Grids, di **razionalizzare i consumi energetici negli edifici e nel settore dei trasporti mediante l’applicazione di nuovi dispositivi e funzionalità;**
- **favorisce il coinvolgimento di altri stakeholder industriali** (es.: car manufacturer, etc.), con l’obiettivo di creare un circolo virtuoso di competenze ed investimenti a livello locale di cui il territorio possa beneficiare.

Macro Categoria Intervento	Costo complessivo in euro
GRIDS PREPARATION E COMMUNICATION NETWORK e FUNZIONALITA' EVOLUTE SMART GRIDS	12.448.000
SMART URBAN SERVICES	4.400.000
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	300.000
ATTIVITA' Smart Grids SU COMUNI LIMITROFI (Cagnano – Scoppito)	TBE
Costo totale del Progetto in euro	17.500.000



4. Lo stato di attuazione

Focus Sottoservizi. Comune di L'Aquila



Università degli Studi dell'Aquila

Attività di ricerca e trasferimento tecnologico


Services & applications

soluzioni avanzate per l'erogazione di servizi ad elevata QoS


- On-demand HDTV
- Ultra-fast cloud services

Service	Bit Rate (bit/s)
Standard TV	2.1 M
HDTV	8.8 M
2D Cinema	21.3 M

- Long-reach PON con sistema innovativo di codifica
- consente distanze fino a 80km su PON senza costi aggiuntivi
 - Self-Seeded RSOA-based PON
 - Capacità di auto configurazione di lunghezza d'onda con tecnologia low-cost (sostituisce costosi laser)
- Reti di sensori e servizi in mobilità

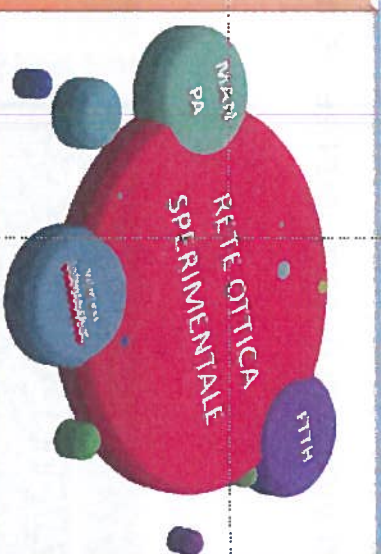

- Applicazioni multimediali
- Integrazione e coordinamento dei livelli di sessione e networking per la gestione efficace di servizi on-demand (Network Service Control Layer)
- Cloud services



Networking e tecnologie trasmissive

soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi e per l'incremento della velocità trasmissiva e della larghezza di banda


- Modalità "sleep"
- Soluzioni PON avanzate: long-reach PON, wavelength-routing, QCDMA, OFDMA.
- Tecnologie wireless pervasive a supporto della smart city




4. Lo stato di attuazione

Interventi pubblici - 56 Comuni del Cratere*

Numero interventi

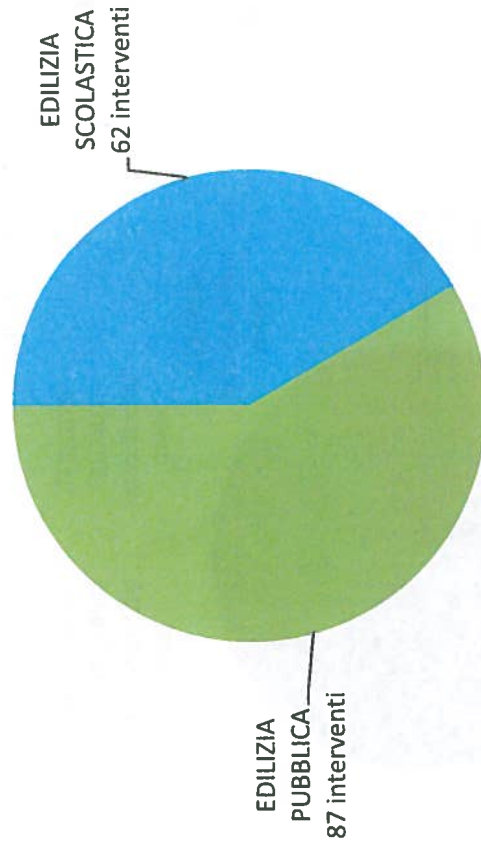

Importi

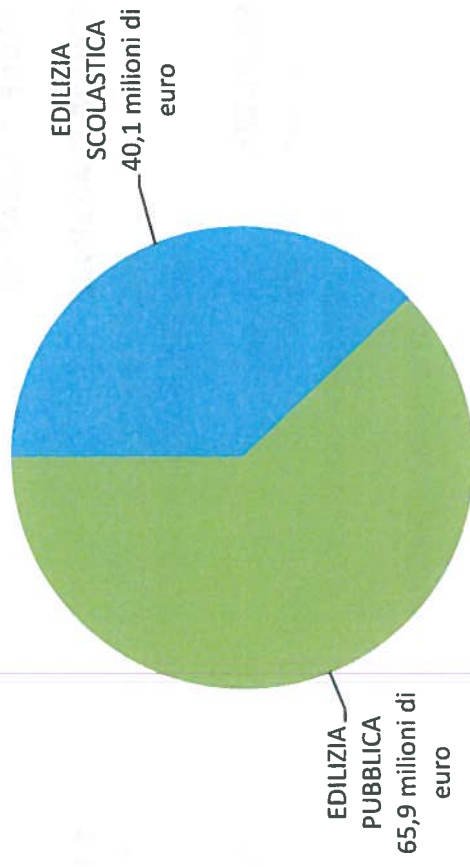

* Al netto degli interventi della Direzione Regionale BB.CC. Rielaborazioni di informazioni contenute in Delibere, Decreti e OPCM (dati soggetti a verifica)




4. Lo stato di attuazione

Focus Interventi pubblici - 56 Comuni del cratere. Delibera CIPE 135 del dicembre 2012.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Importo milioni di euro
1 PROGETTI STRATEGICI	€ 43,70
2 EDILIZIA CIMITERIALE	€ 12,80
Edilizia Cimiteriale (DCD 78/2011)	€ 3,30
Edilizia Cimiteriale (nuovi interventi)	€ 9,50
3 SICUREZZA	€ 4,04
Fossa - Opere di difesa pendio (DCD 135/2012)	€ 2,50
Castelnuovo - Recupero ambientale ex cava comunale (DCD 115/2012)	€ 0,03
Lucoli - messa in sicurezza costone Villaggio Prato Lonaro	€ 1,51
4 PROGETTI COMUNI	€ 3,50
5 REDAZIONE PDR RESIDUI	€ 3,15
TOTALE GENERALE	€ 67,19

Risultano di recente finalizzate per interventi pubblici risorse per 67,2 milioni di euro. Le assegnazioni previste in delibera ammontano a 188 milioni di euro.

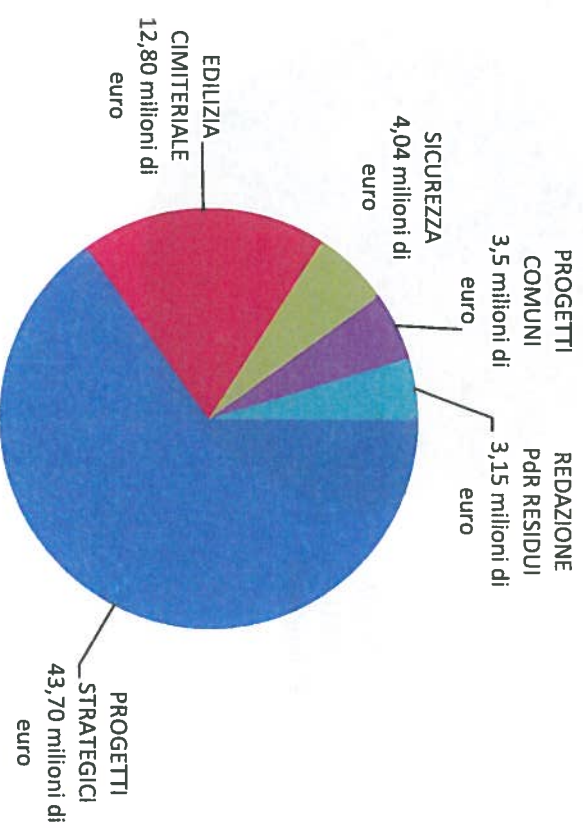


L'utilizzo dei fondi di cui alla Delibera CIPE 135/2012 nei 56 Comuni del cratere sismico tiene conto degli atti di programmazione emanati nel corso della gestione commissariale e degli atti di accordo tra USRC e coordinatori aree omogenee.




4. Lo stato di attuazione

Interventi sui Beni culturali. L'Aquila e altri Comuni: Decreto 24/2010 (18,325 milioni di euro) e Delibera CIPE 135/2012 (70,5 milioni di euro)

Numero interventi

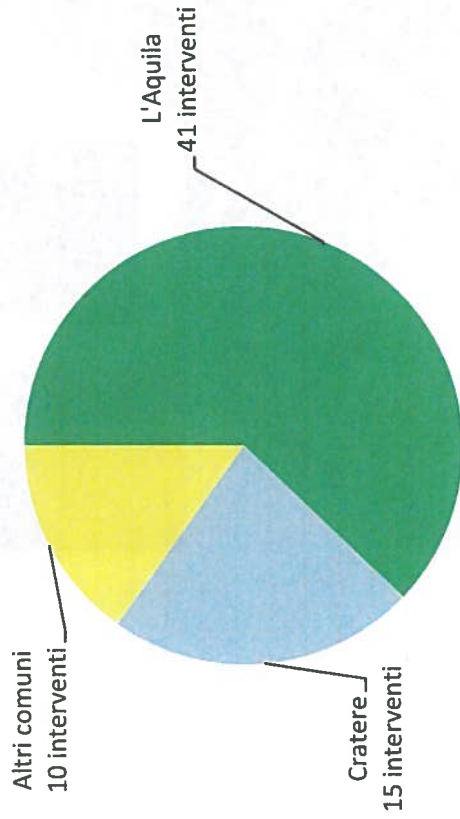

Importi

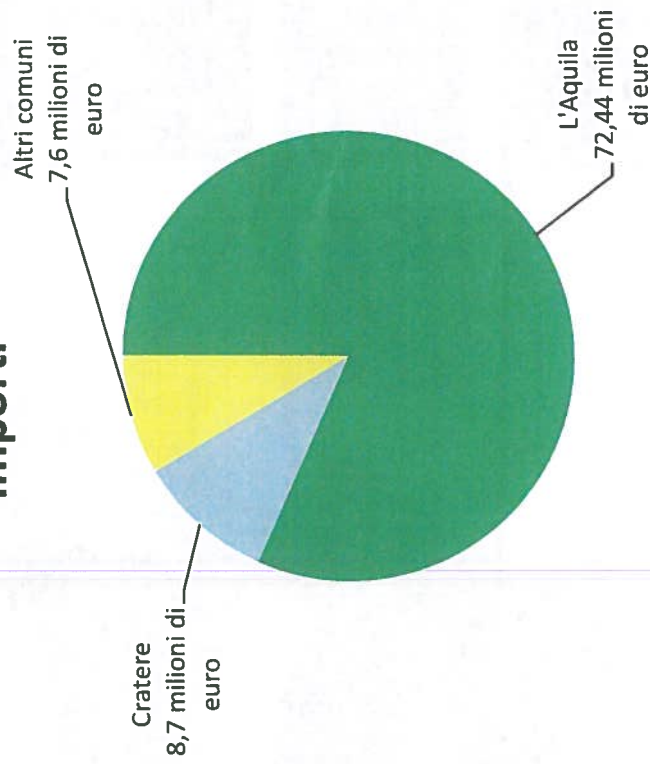


* Rielaborazioni di informazioni contenute in Delibere, Decreti e OPCM (dati soggetti a verifica)



Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la Coesione Territoriale

4. Lo stato di attuazione

L'open data della ricostruzione. Comune dell'Aquila

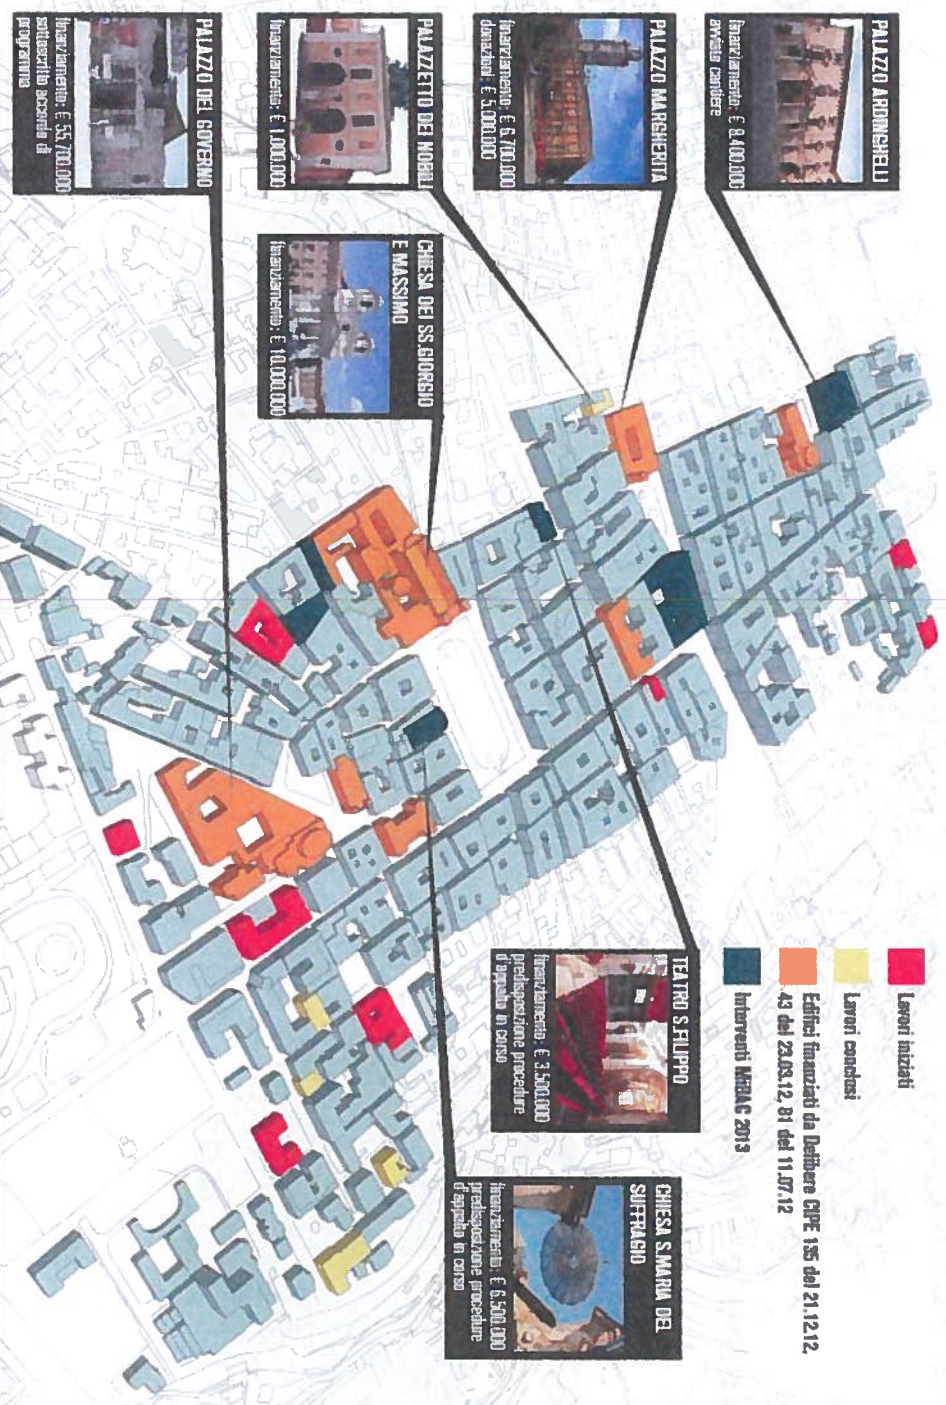

COMUNE DI L'AQUILA
Assessorato alla Ricostruzione
Settore Finanziamento e Regimazione del territorio

CANTIERI DELLA RICOSTRUZIONE NELL'ASSE CENTRALE

Monitoraggio
degli interventi



5. Lo sviluppo



5. Lo sviluppo

Quale strategia per lo sviluppo ?

I principali driver:

- Sostenere i progetti industriali innovativi di realtà già consolidate sul territorio.
- Realizzare una ricostruzione intelligente e di avanguardia: non tutto come prima ma tutto meglio di prima (*smart city*).
- Promuovere attività capaci di trattenere sul territorio il valore aggiunto (salari, profitti) generato dal processo di ricostruzione.
- Valorizzare le unicità architettoniche, storiche e ambientali del territorio per uno sviluppo economico sostenibile e l'incremento duraturo dell'occupazione.



5. Lo sviluppo

Sviluppo. Delibera CIPE 135 del dicembre 2012 (100 milioni di euro).
Decreto del Ministro per la Coesione Territoriale

Assi per lo sviluppo del territorio
Rilancio, a fini turistici, dell'intero comprensorio del Gran Sasso caratterizzato da rilevanti potenzialità di sviluppo legate al turismo culturale e della montagna (invernale ed estivo), dalla facile accessibilità e dalla vicinanza a poli gravitazionali molto importanti.
Attività di ricerca - reti ottiche innovative, edilizia e tecniche di restauro e recupero
Promozione delle eccellenze della Filiera agroalimentare (es. zafferano, tartufo, ecc.)
Attività produttive caratterizzate da elevati livelli di innovazione e crescita (farmaceutico, aereospazio, telecomunicazioni, avionica, tecnologie per la sicurezza)
Piccole e medie imprese innovative e <i>spin-off</i> di ricerca principalmente collegati alla realizzazione di infrastrutture e servizi per le <i>smart-cities</i>
Ricerca e sviluppo sperimentale coinvolgendo Università ed Enti di ricerca
Turismo. Infrastrutture turistiche e creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa e progetti innovativi finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica nei mercati internazionali.

